

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 25 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2017.8.28—2017.9.3)

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2017 年 8 月 28 日至 2017 年 9 月 3 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2017 年 9 月 3 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2017 年 8 月 29 日，F~G 轴交 2~8 轴、M~J 轴交 1~8 轴地下室顶板浇筑完成。

2、2017 年 8 月 30 日，M~J 轴/8~12 一层内架完成，A~D 轴交 1~10 轴一层内架及梁板模板制作安装完成；

3、2017 年 9 月 1 日，A~D 轴交 1~10 轴一层梁板钢筋绑扎进行中。

4、2017 年 9 月 3 日，A~D 轴交 1~10 轴一层梁板钢筋绑扎完成，预埋完成。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、参加 2017 年 8 月 30 日的监理例会；
- 2、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 3、熟悉项目资料，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

1、 2017年8月30日收到纸质版签证5张，纸质版设计变更以及图纸会审（从开工到现在）。

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握钢筋绑扎、模板支模、混凝土浇筑及养护等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好跟踪记录（包括照片和文字记录）。


六、存在的问题和建议

无

湖北众信工程造价咨询有限公司

2017年9月3日


附现场照片（摘选）：

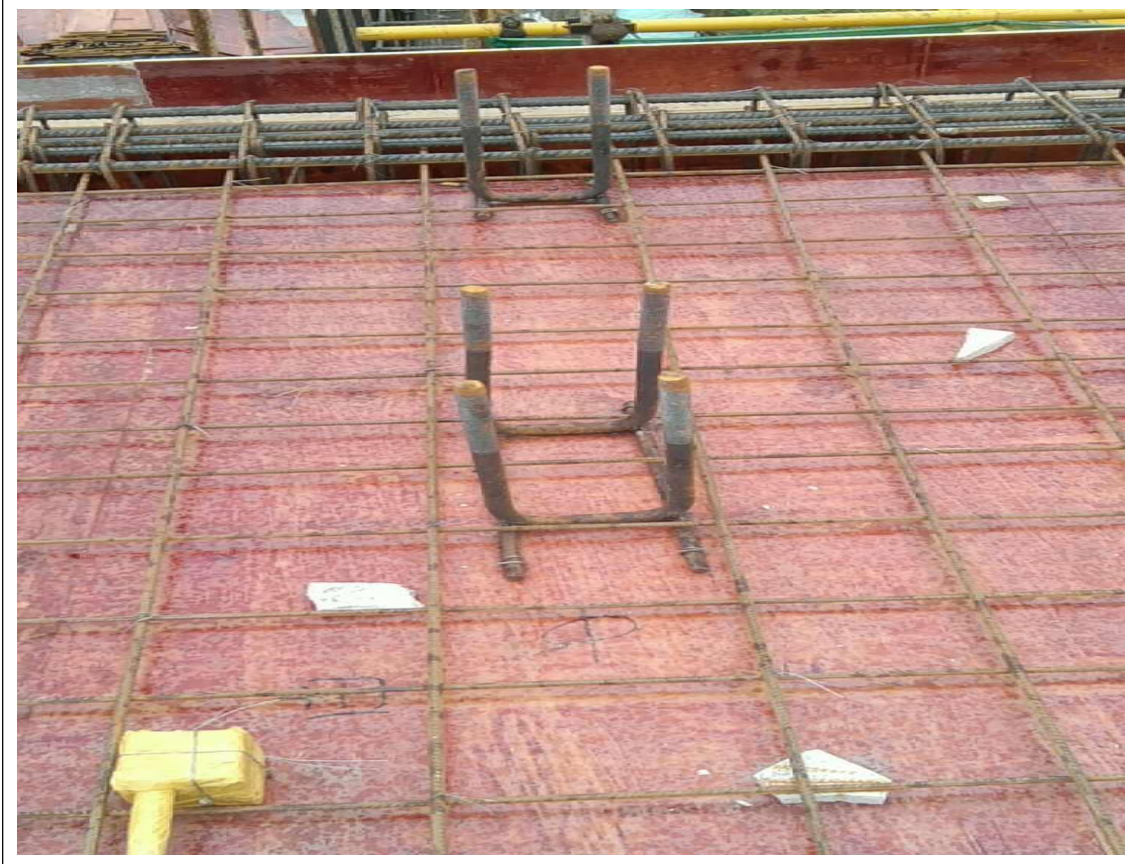









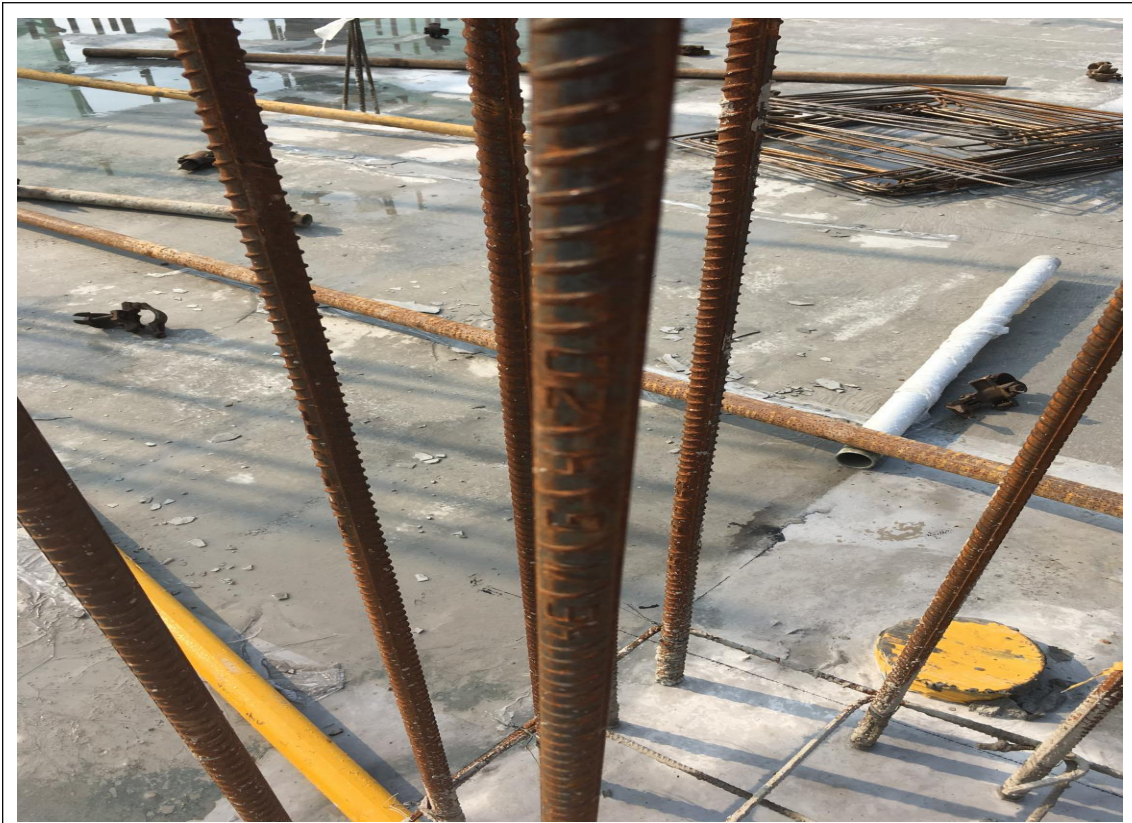



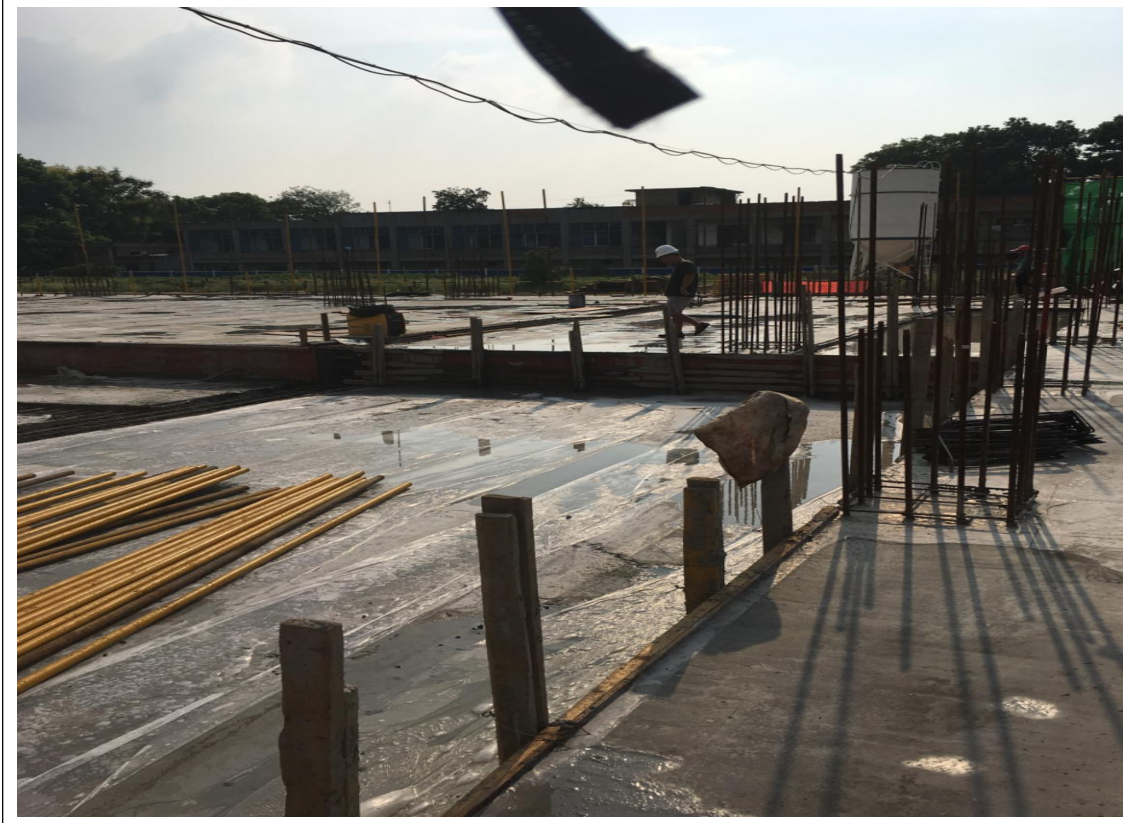

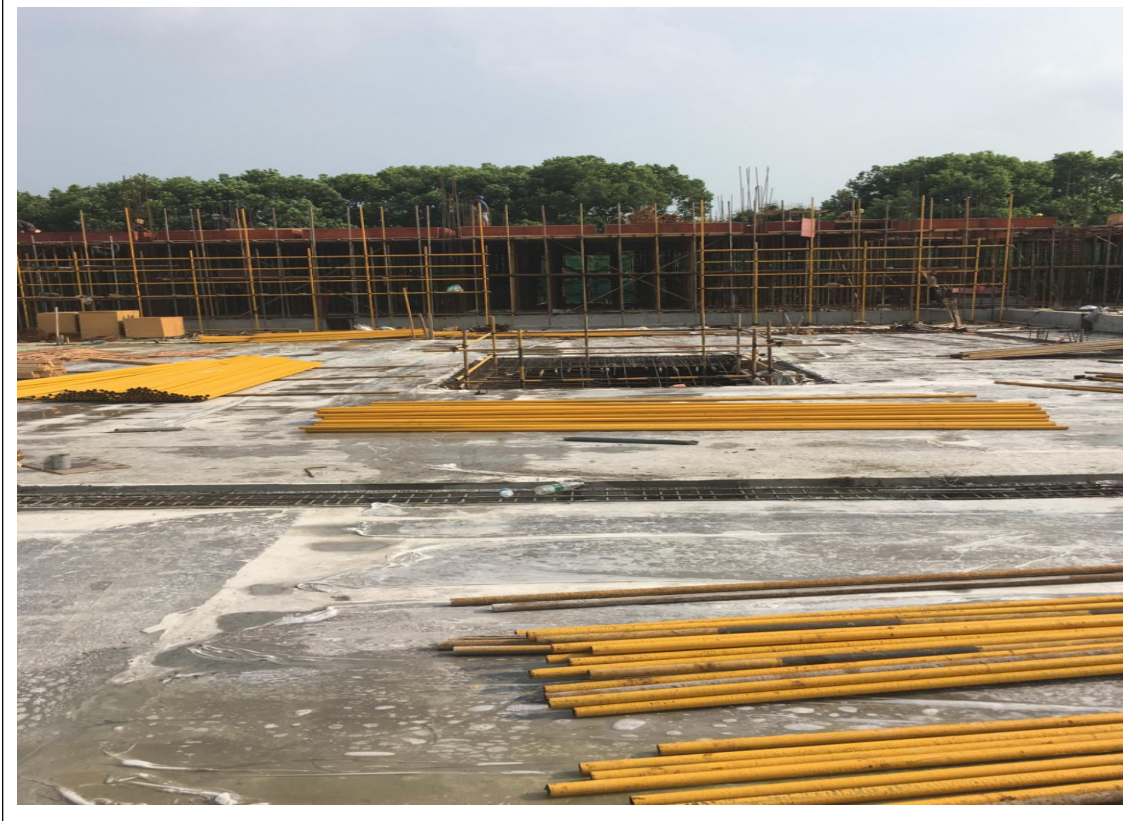













2017年8月周项目计划表 (8.24—8.30)

填写部门: 新八建设集团有限公司
 地址: 山东省济南市高新区
 电话: 0531-88888888

项目名称	劳动力 (人)		项目整体进度	管理目标 (摘要描述)		存在问题及建议	责任人	备注
	应配	实配		本周完成工作	下周计划			
			主体分部施工阶段	完成F-G/2-8轴、M-J/1-8轴地下室顶板浇筑 M-J/8-12轴一层内架完成 A-D/1-10轴一层内架及梁板模板制作安装	钢筋工 A-D/1-10轴一层梁板钢筋绑扎完成 泥工 A-D/1-10轴一层柱、梁、板砼浇筑 木工 M-J/8-12轴一层梁、板模板制作安装 F-G/2-4轴高支模内架完成	2017.8.30 验收合格 8.24 基础分部二次验收合格 下步地下室顶板浇筑 ① 有迪马路监测, 能提前预警 ② 内架部门顶撑不到位 8.28 地下室顶板浇筑 ③ 计划 11月封顶 ④ 梁柱节点二次浇筑 ⑤ 地下室外变更(盲沟) ⑥ 截水沟及明管(管位)与结构同步进行		













