

# 跟踪日志

天气:晴

工程名称：华中农业大学体育训练馆

日期：2017年9月4日

星期一

记录人：朱惠惠

## 一：现场情况：

- 1、 P-G/1-9 轴三层梁板砼浇筑，砼养护；
- 2、 A-F/1-9 轴二层梁板钢筋绑扎。；

## 二：现场照片：

主次梁相交的位置次梁旁每边附加三根箍筋，实际每边布置两根箍筋；




G-P/1-9 轴梁板砼浇筑完毕，预留的等待张拉的钢绞线接头；



待管道安装完毕后，再浇筑砼的水井板；



梁的纵筋部分端部弯折不足  $15D$ ;

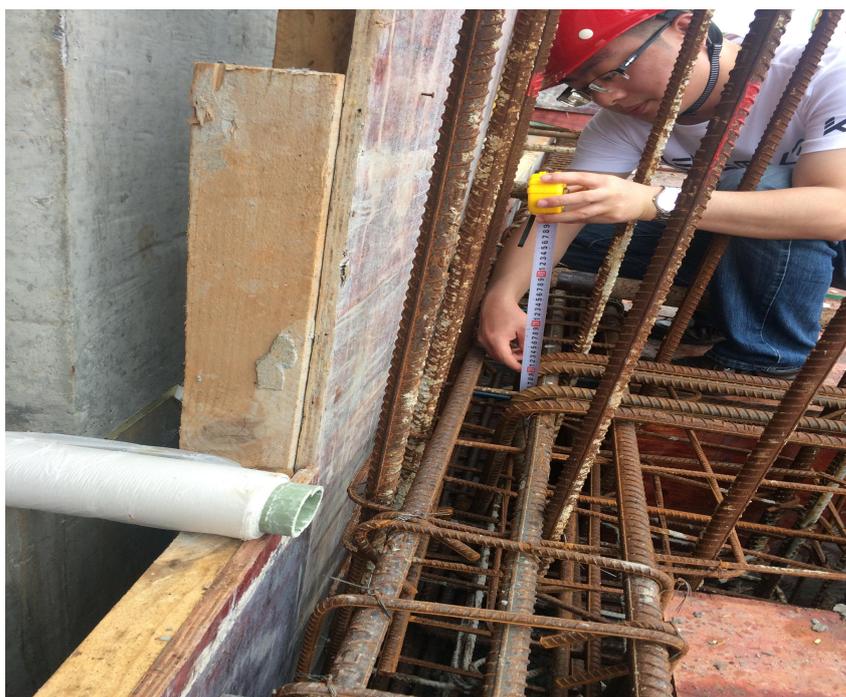

柱子的直锚纵筋;

