

农业科技创新综合实验楼工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2018年12月13日~2019年1月13日

跟踪日志

天气：晴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2018-12-13


星期四


记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、农业科技创新综合实验楼工程准备进入施工阶段，现场场地标高测量。
- 2、现场原有建筑硬化场地测量，以便后期硬化物拆除工程量的计算。



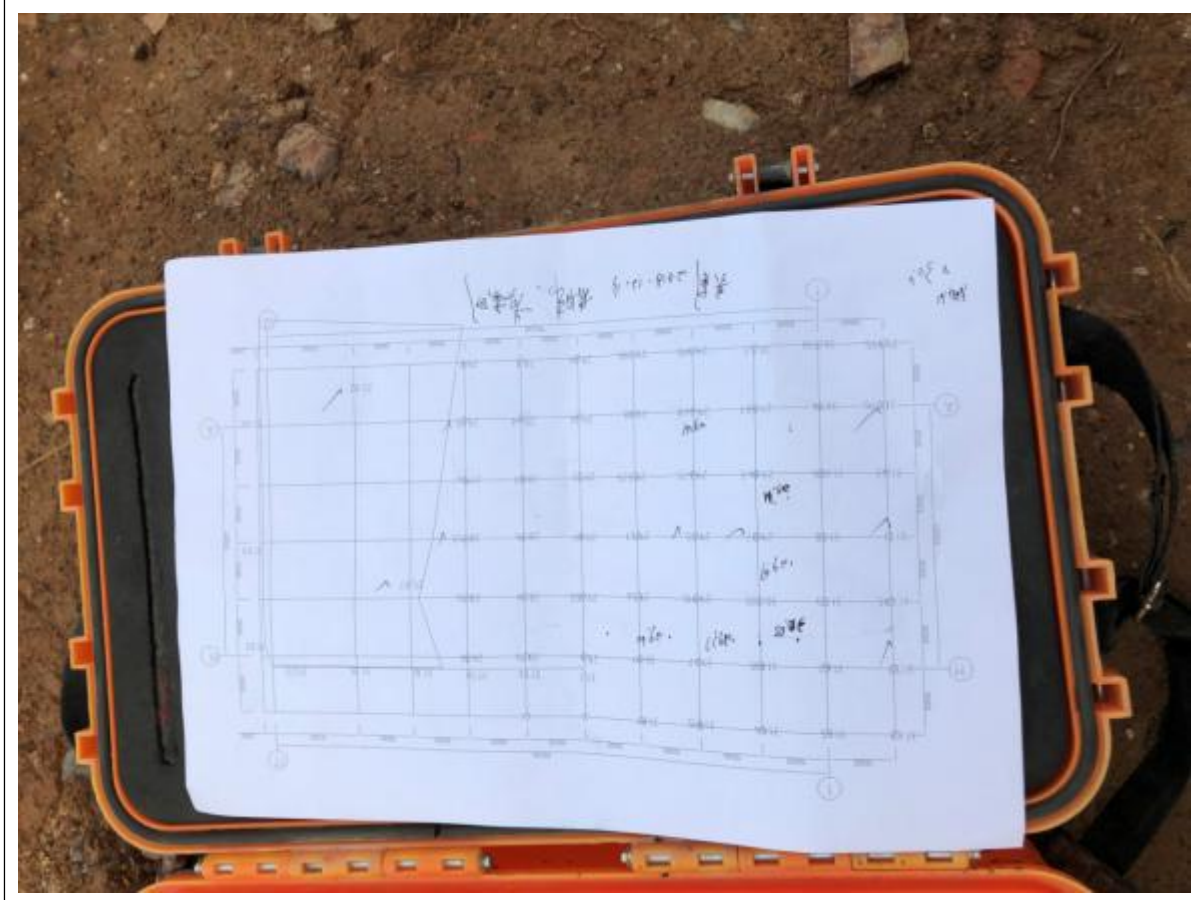

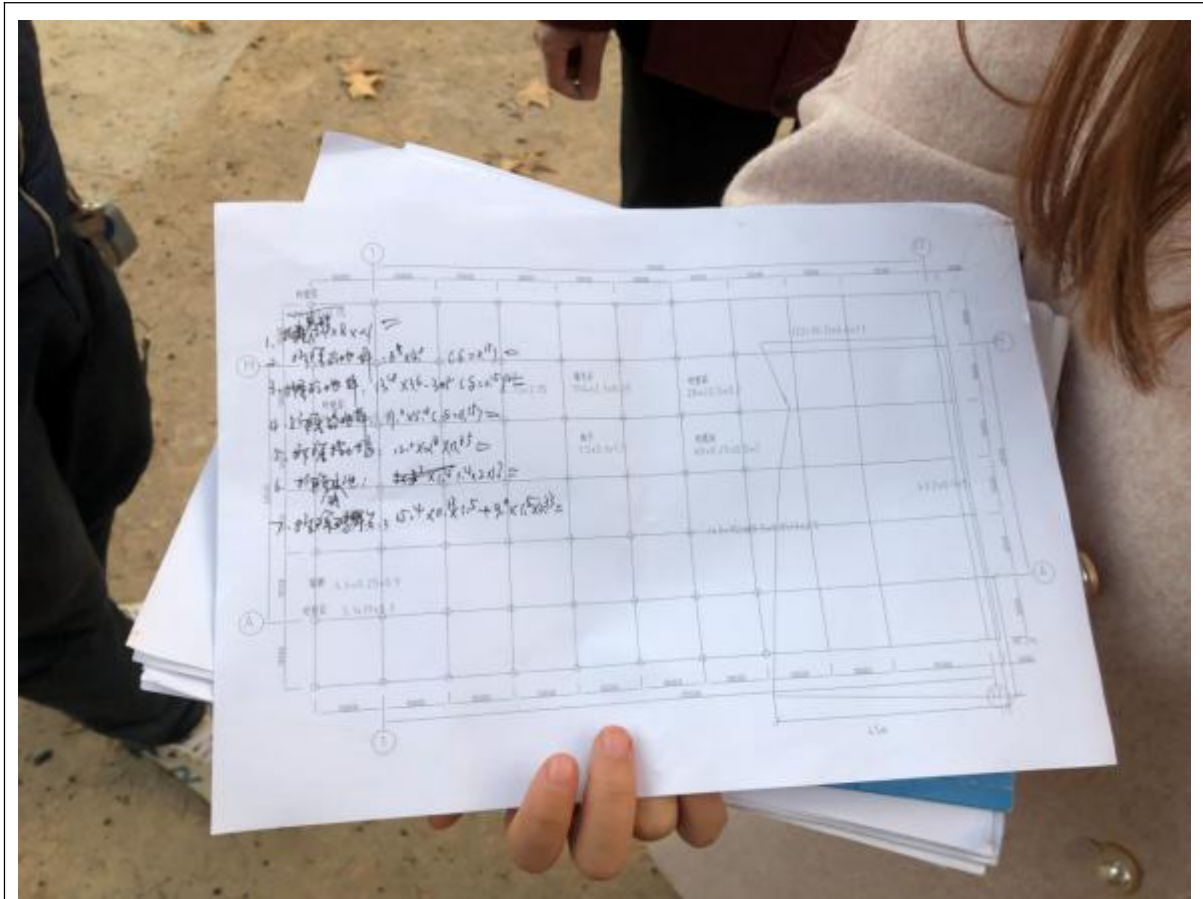

跟踪日志

天气：晴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2018-12-17

星期一


记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、今日现场第二次收方，池塘平面尺寸+深度测量。
- 2、要拆除砼地面面积、厚度
- 3、挖机进场进行场地平整。





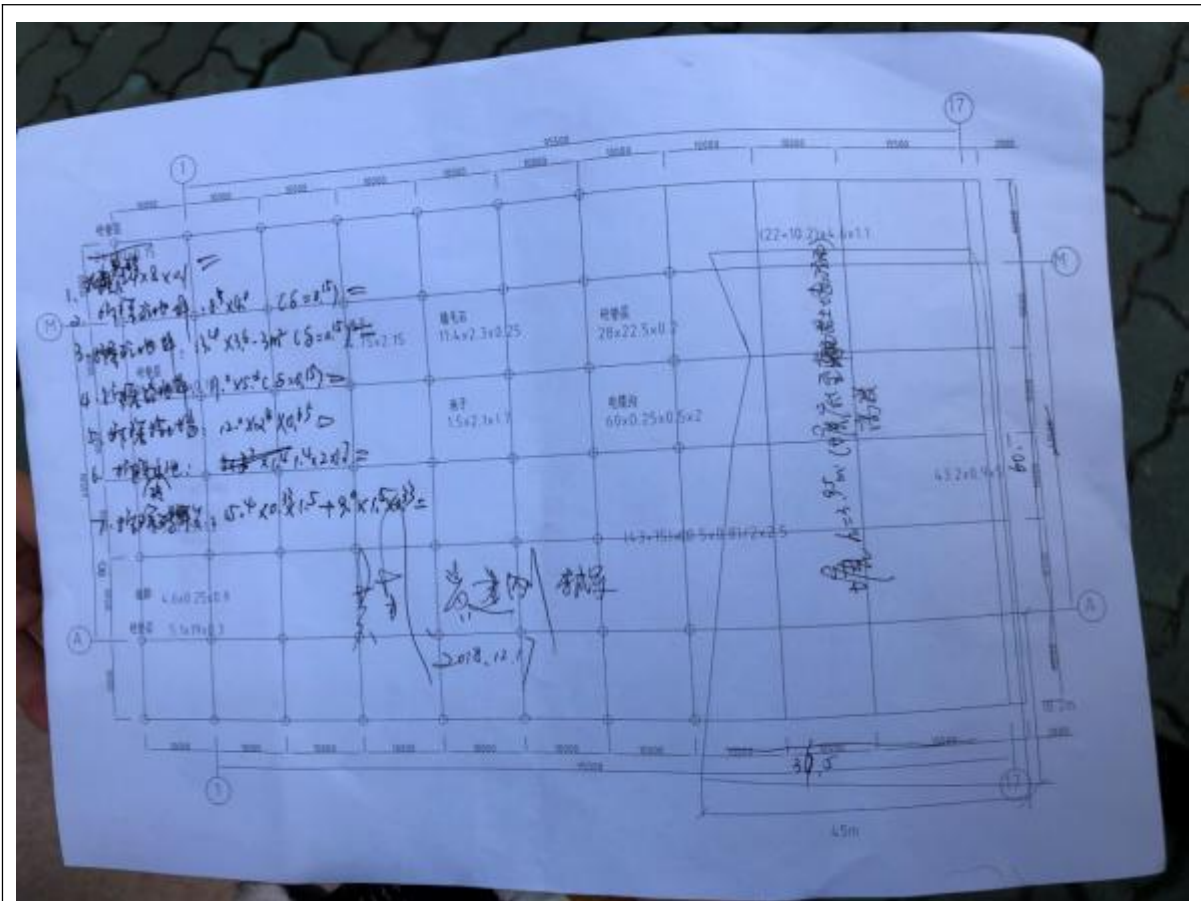

跟踪日志

天气：晴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2018-12-19

星期三

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、现场洗车槽的施工。
- 2、现场土方平整。





跟踪日志

天气：雨后阴天

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2018年12月27日

星期四

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

清明节现场人少

- 1、场地门柱基础养护。
- 2、雨后挖机暂停止施工。





跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2018-12-29

星期六

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

1、现场电缆迁迁移。





跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2019-1-3

星期四

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、现场电缆沟盖板拆换收方，由 8 公分换成 15 公分厚的承重盖板。
- 2、沟盖板拆换处步砖拆除重铺。







农业科技創新綜合實驗場
 ① $2 \times (30.5 \times 3.5 - 4.7 \times 3.1) = 60.3 \times 2 = 120.6$ (單位: 天際蓋板, 每塊蓋板 150 厚)
 ② 人行道鋪設 120.6 \times 1.55 = 186.93 m^2 (不含材料)

楊子龍 2019.11.5.
 共計 2019.11.5 楊子龍
 湖南泰盛建設有限公司

跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2019-1-8

星期二

记录人：祝红霞 张超

--	--	--

跟踪日志

天气：阴

气温：

工程名称：农业科技创新综合实验楼工程

日期：2019-1-15

星期二

记录人：祝红霞 张超

一：现场情况：

- 1、现场室外步道沟盖板安装、步砖安装。
- 2、挖机因土过湿暂停施工。
- 3、室外配套工程施工。



