

华中农业大学第三综合实验楼项目

施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 19 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2017.7.17—2017.7.23)

华中农业大学第三综合实验楼项目

跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2017 年 7 月 17 日至 2017 年 7 月 23 日的工作情况汇报如下：

一、工程进度情况：

截止 2017 年 7 月 23 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2017 年 7 月 19 日，监理例会照常召开，6-10/A-E 轴钢筋绑扎，6-10/A-E 轴底板混凝土浇筑完成；

2、2017 年 7 月 20 日，6-10/A-E 轴避雷接地，1-6/A-E 轴钢筋绑扎完成。

3、2017 年 7 月 21 日，1-6/A-E 轴底板混凝土浇筑，1-8/M-J 轴基础防水卷材及保护层完成。

二、报告期内跟踪审计工作内容：

1、日常工地巡视，密切关注施工进度；

2、熟悉项目资料，为后期的跟踪审计工作做准备。

三、造价控制情况：

无

四、资料收集情况：

1、 这周无

五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握基础防水、砖胎膜、基坑支护、钢筋绑扎、混凝土浇筑及养护等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好跟踪记录（包括照片和文字记录）。

六、存在的问题和建议

1、这周大部分天气气温较高，要抓住早晚气温相对较低时段加紧施工，避开高温时段，做好防暑降温工作；随时关注基础防水问题，防水是否达到图纸设计防水要求，及时跟监理单位和甲方沟通处理方案；边坡喷锚厚度要达到锚固要求，及时提供设计方案；混凝土强度及养护要到标准要求。

2、钢筋也陆续进场，重点关注进场钢筋规格型号是否与施工图纸要求相符。


湖北众信工程造价咨询有限公司


2017年7月23日

附现场照片（摘选）：

备注:



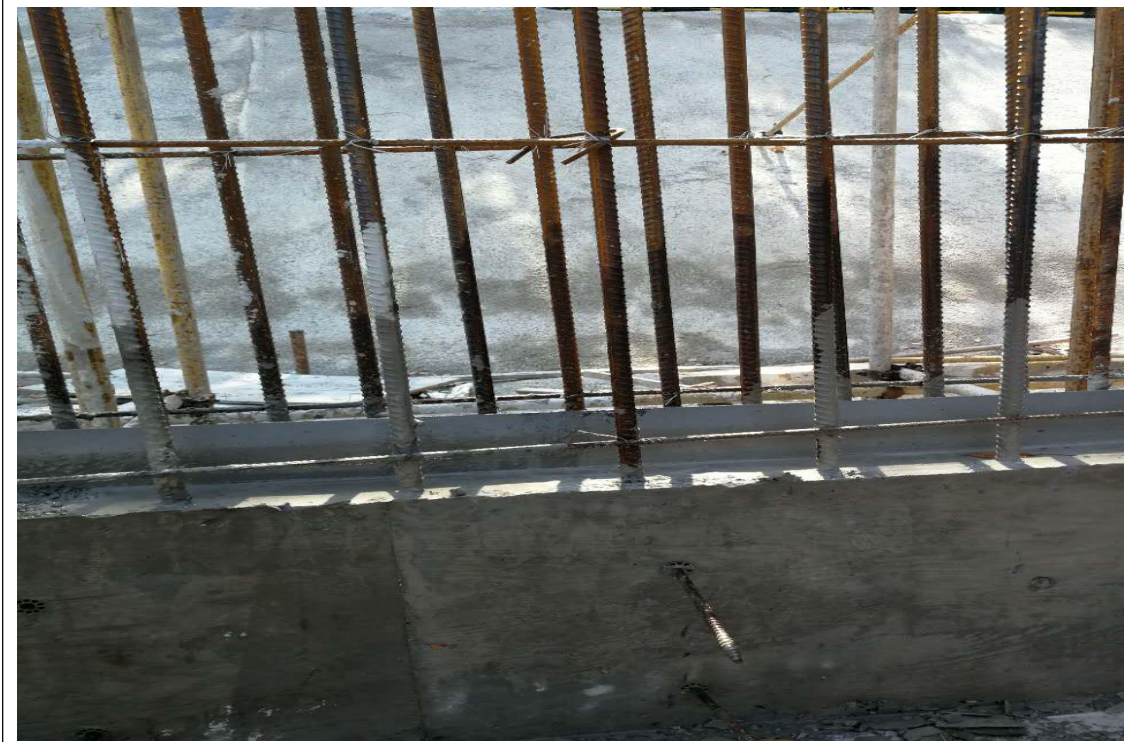

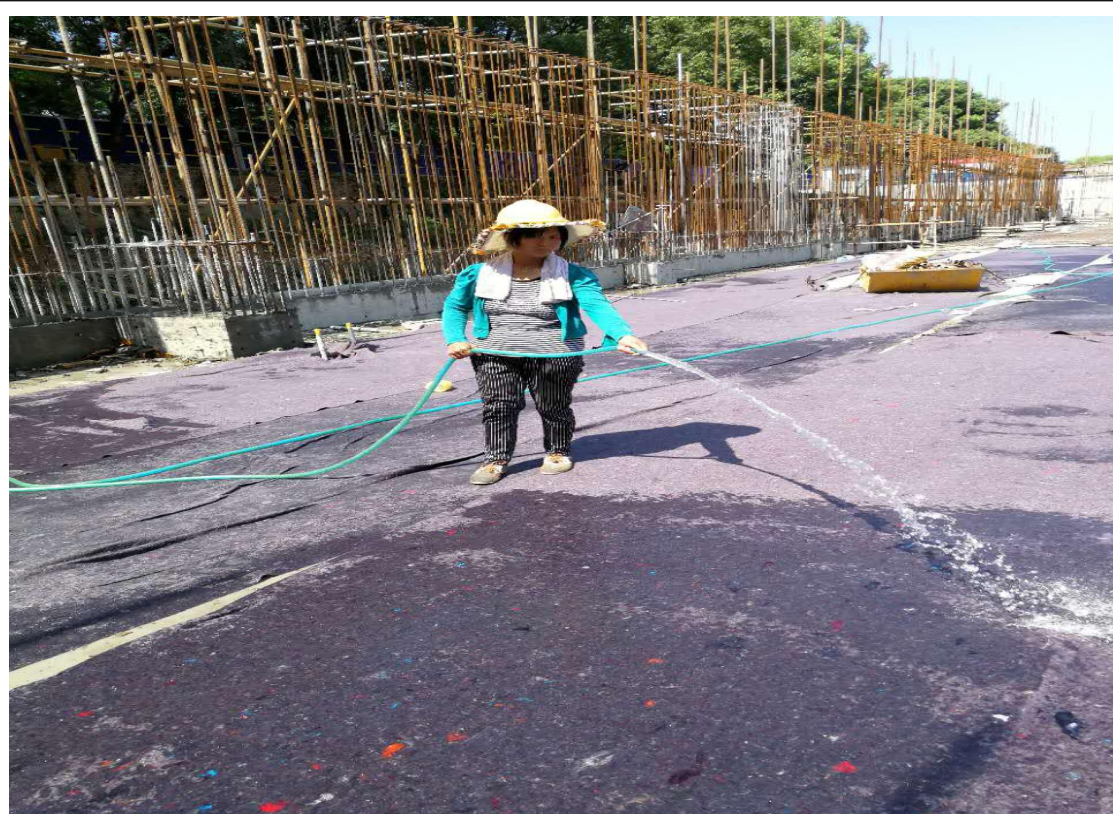

06:03

2017-07-21 星期五 华中农业大学



华农三综

☁ 34°C

2017/7/19



华农三综

☁ 34°C

2017/7/19

