

跟踪日志

天气:晴

工程名称：华中农业大学体育训练馆

日期：2017年10月9日

星期一

记录人：朱惠惠

一：现场情况：

- 1、 P-G/1-9 轴三层墙柱钢筋绑扎，四层梁板支模，一层卫生间、淋浴间预埋 PVC 排水管；
- 2、 A-F/1-9 轴二层墙柱钢筋绑扎，三层楼板支模。；

二：现场照片：

张拉预应力钢绞线；




现场搭设的卸料平台；



玻璃幕墙预埋铁件钢板为 1CM 的镀锌钢板；



地脚螺栓为螺纹 18 的镀锌钢筋，长度为 200MM；

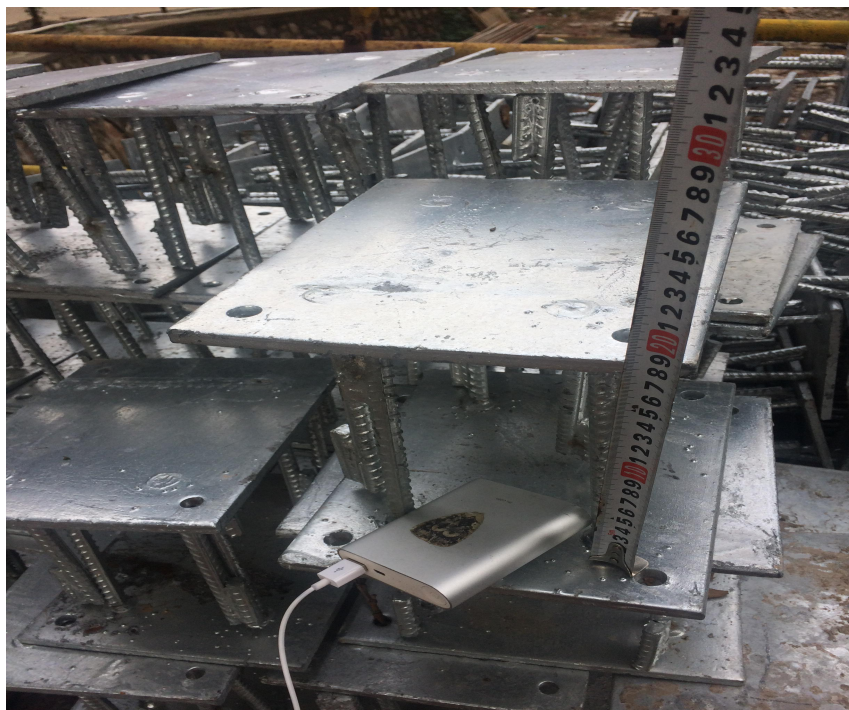

钢板宽度为 200MM；



钢板长度为 250MM;



现场堆放的镀锌预埋铁件;

