

# 华中农业大学第三综合实验楼项目

## 施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 24 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2017.8.21—2017.8.27)

# 华中农业大学第三综合实验楼项目

## 跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2017 年 8 月 21 日至 2017 年 8 月 27 日的工作情况汇报如下：

### 一、工程进度情况：

截止 2017 年 8 月 27 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

- 1、2017 年 8 月 21 日，H~M 轴/1~8 轴地下室顶板钢筋开始绑扎，M~J 轴/8-12 轴地下室顶板梁板钢筋绑扎完成，水电预埋完成。
- 2、2017 年 8 月 23 日，M~J 轴/8~12 轴地下室顶板梁板混凝土养护，M-J 轴/8~12 地下室顶板砼浇筑完成；
- 3、2017 年 8 月 24 日，F~G 轴/2~8 轴木工地下室顶板模板制作安装完成，M~J 轴交 1~8 轴、F~G 轴交 2~8 轴剪力墙、柱钢筋绑扎完成。
- 4、2017 年 8 月 25 日，D~G 轴 1~8 轴顶板钢筋完成，H~M 轴/1~8 轴地下室顶梁板养护。

### 二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、参加 2017 年 8 月 24 日的基础部分（地下室顶板）工程验收；
- 2、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 3、熟悉项目资料，为后期的跟踪审计工作做准备。

### 三、造价控制情况：

无

#### 四、资料收集情况：

1、 这周无

#### 五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握钢筋绑扎、模板支模、混凝土浇筑及养护等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好跟踪记录（包括照片和文字记录）。

#### 六、存在的问题和建议

无

湖北众信工程造价咨询有限公司


2017年8月27日

附现场照片（摘选）：







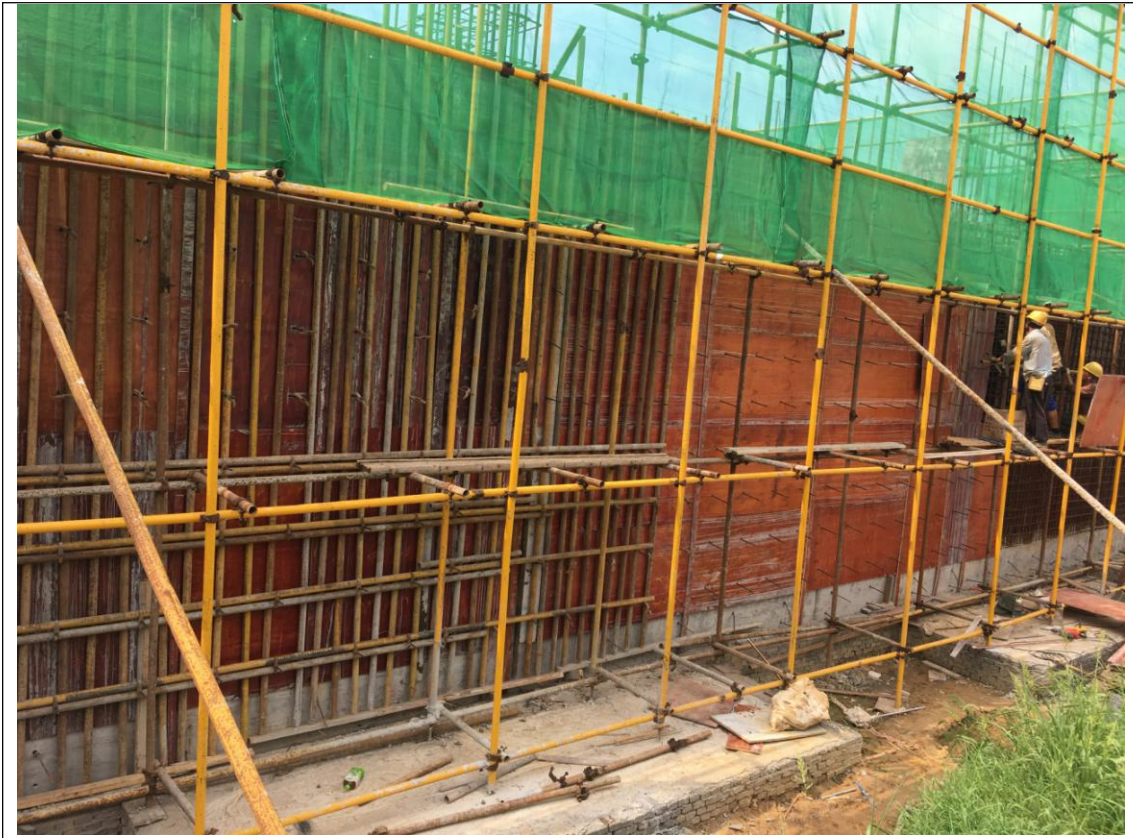










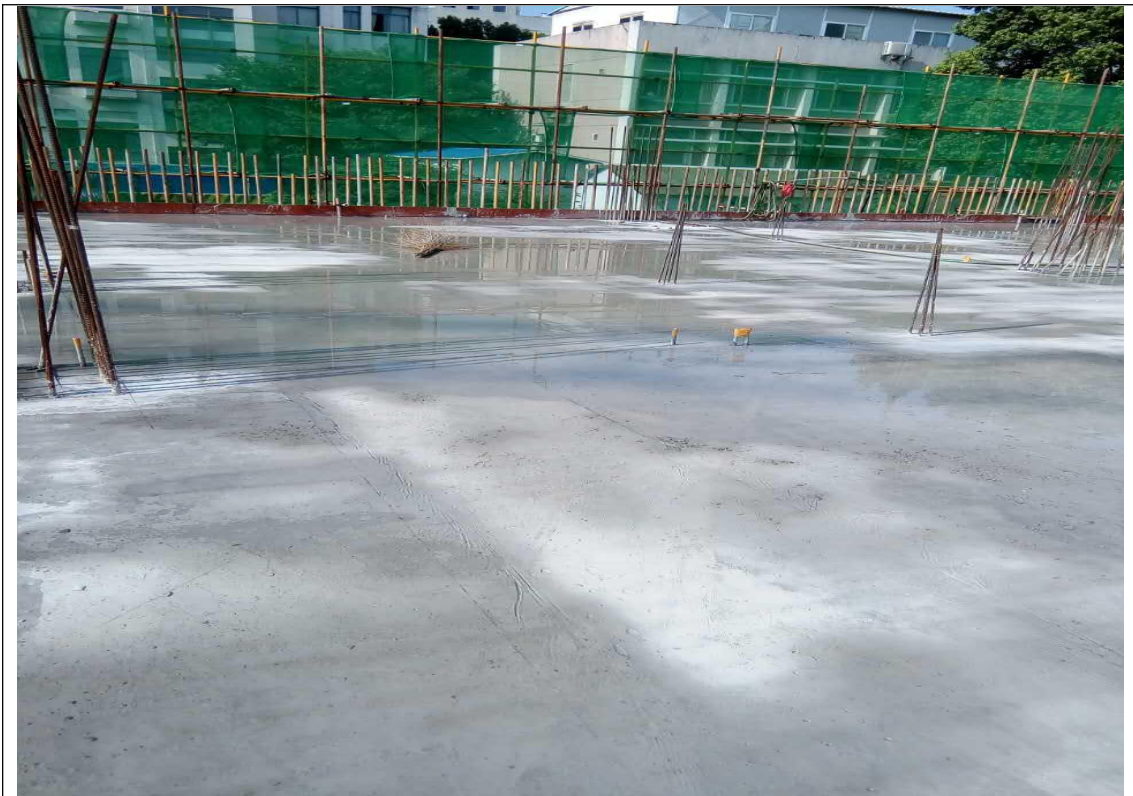

2017 8月份 Date: \_\_\_\_\_ Page: \_\_\_\_\_  
 22号  $\Phi 25$  9件 x 800, 24.948  
 $\Phi 14$  4件 x 1800, 7.840  
 车号 鄂APS187  
 盘螺  $\Phi 10$  12件  
 $\Phi 8$  12件







