

# 华中农业大学第三综合实验楼项目

## 施 工 阶 段 审 计 周 报

(第 15 期)

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：胡银波

跟踪人员：余丽

跟踪时间：(2017.6.19—2017.6.25)

# 华中农业大学第三综合实验楼项目

## 跟踪审计工作周报

华中农业大学：

我们接受委托对贵校新建的华中农业大学第三综合实验楼项目进行跟踪审计工作，现将 2017 年 6 月 19 日至 2017 年 6 月 25 日的工作情况汇报如下：

### 一、工程进度情况：

截止 2017 年 6 月 25 日，第三综合实验楼的施工进度情况如下：

1、2017 年 6 月 20 日，今天在挖 1~2 轴交 A~G 轴基础土方，北区 10~12 轴交 J~M 轴土方自西向东开挖并同时放坡，砌砖基础胎膜及粉刷（1~4 轴交 A~G 轴）。

2、2017 年 6 月 21 日，今天第一次召开监理例会，参与单位有基建处刘更生、林烁科长；监理单位杨述红、余宽、徐青平、胡明；施工单位经理邵工、总工杨工、资料员左工、刘工、邵云飞。

3、2017 年 6 月 22 日，靠 1 轴局部边坡喷锚，地下室浇筑基础垫层、基础间底板以下素土回填夯实，局部回填细沙。

4、2017 年 6 月 23 日，靠 1 轴局部边坡喷锚延长。

### 二、报告期内跟踪审计工作内容：

- 1、日常工地巡视，密切关注施工进度；
- 2、熟悉项目资料，为后期的跟踪审计工作做准备。

### 三、造价控制情况：

无

#### 四、资料收集情况：

1、 这周无

#### 五、下周工作计划：

1、密切关注和掌握场地平整、土方开挖、回填、弃土外运等施工情况。

2、密切关注和掌握雨季排水施工情况。

3、做好跟踪记录（包括照片和文字记录）。

#### 六、存在的问题和建议

1、这周阴雨天气比较多，要加快步伐，随时关注基底土质情况，是否达到老土层，是否有浮土和泡水现象，及时跟地址勘查和甲方沟通处理方案；边坡喷锚厚度要达到锚固要求；基础间回填土要到达夯实系数。


2、钢筋也陆续进场，重点关注进场钢筋规格型号是否与施工图纸要求相符。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2017年6月25日

附现场照片（摘选）：

备注：

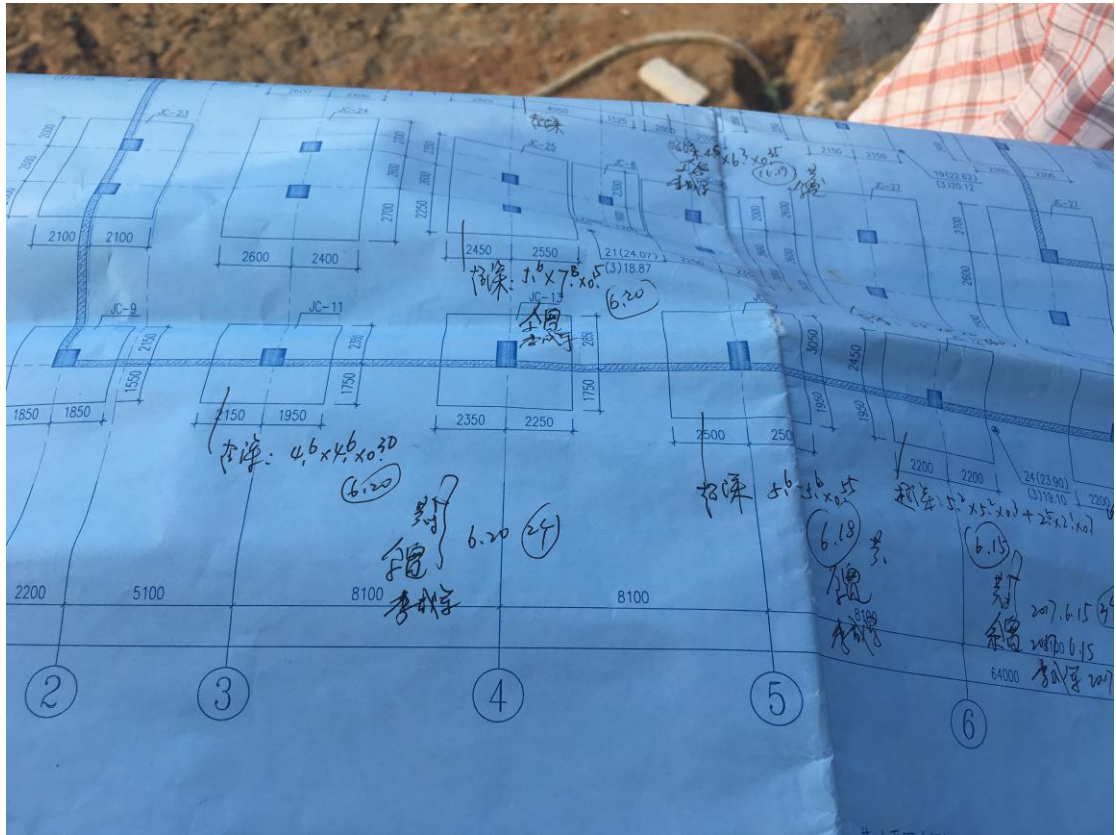









华农三综

☁ 32°C  
2017/6/21



华农三综

☁ 32°C  
2017/6/21

















